
标识号	标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称					
1	1	启动	3 days	2020年11月2日	2020年11月4日							
2	2	组建核心团队	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日		项目经理,产品经理,技 ^才					
3	3	干系人分析	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日		<mark>项目经理</mark>					
4	4	里程碑计划	1 day	2020年11月2日	2020年11月2日		<mark>项目经理</mark>					
5	5	制定项目章程	1 day	2020年11月3日	2020年11月3日	2, 3, 4	<mark>项目经理</mark>					
6	6	项目启动大会	1 day	2020年11月4日	2020年11月4日	5	UI设计师,测试专家,产品					
7	7	规划	14 days	2020年11月5日	2020年11月24日]						
8	8	规划范围	4 days	2020年11月5日	2020年11月10日							
9	9	制定需求说明书	1 day	2020年11月5日	2020年11月5日	6	需求专家					
10	10	界面设计	1 day	2020年11月6日	2020年11月6日	9	UI设计师					
11	11	详细设计说明书	1 day	2020年11月6日	2020年11月6日	9	UI设计师					
12	12	项目范围说明书	1 day	2020年11月6日	2020年11月6日	9	<mark>项目经理</mark>					
13	13	创建WBS	1 day	2020年11月9日	2020年11月9日	10, 11, 12	项目经理,UI设计师					
14	14	形成范围基准	1 day	2020年11月10日	2020年11月10日	13	<mark>项目经理</mark>					
15	15	规划时间	8 days	2020年11月11日	2020年11月20日							
16	16	排列工作包顺序	1 day	2020年11月11日	2020年11月11日	14	<mark>项目经理 </mark>					
17	17	估算资源	1 day	2020年11月12日	2020年11月12日	16	<mark>项目经理 </mark>					
18	18	估算持续时间	1 day	2020年11月13日	2020年11月13日	17	<mark>项目经理 </mark>					
19	19	制定进度计划	1 day	2020年11月16日	2020年11月16日	18	<mark>项目经理 </mark>					
20	20	形成进度基准	1 day	2020年11月17日	2020年11月17日	19	<mark>项目经理</mark>					
21	21	规划成本	3 days	2020年11月18日	2020年11月20日							
22	22	项目成本估算	1 day	2020年11月18日	2020年11月18日	20	<mark>项目经理 </mark>					
23	23	项目预算	1 day	2020年11月19日	2020年11月19日	22	<mark>项目经理 </mark>					
24	24	形成范围基准	1 day	2020年11月20日	2020年11月20日	23	<mark>项目经理</mark>					
25	25	规划质量	2 days	2020年11月11日	2020年11月12日							
26	26	制定测试计划	1 day	2020年11月11日	2020年11月11日	14	测试专家					
		任务			手动摘要总成		基线里程碑 ◇					
		拆分		11.77-1 1-12	手动摘要		- 基线总结					
42 D - 2	⇒hZ 1		A	非活动里程碑 ◇			进度					
	ド畅_ml.mpp 020年12月1		<u> </u>			3						
口 <i>河</i> 刃・ 4	020-〒12月1	1,12		非活动摘要 『	【 仅完成时间 ##/四		手动进度 一					
		项目摘要	Ш	■ 手动任务		•						
		外部任务		仅工期	基线							
	第 1 页											


标识号	标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称				
27	27	制定测试用例	1 day	2020年11月12日	2020年11月12日	26	测试专家				
28	28		2 days	2020年11月13日	2020年11月16日						
29	29		1 day	2020年11月13日	2020年11月13日	17	项目经理				
30	30	制定人员配备管理计	_	2020年11月16日	2020年11月16日	29	项目经理				
31	31	规划沟通	1 day	2020年11月17日	2020年11月17日						
32	32		1 day	2020年11月17日	2020年11月17日	30	项目经理				
33	33	规划采购	2 days	2020年11月13日	2020年11月16日						
34	34		1 day	2020年11月13日	2020年11月13日	17	项目经理				
35	35		1 day	2020年11月16日	2020年11月16日	34	项目经理				
36	36		3 days	2020年11月21日	2020年11月24日						
37	37	识别风险	1 day	2020年11月21日	2020年11月21日	15, 21, 25, 28	项目经理				
38	38	风险分析	1 day	2020年11月22日	2020年11月22日	37	项目经理				
39	39	制定风险登记册	1 day	2020年11月23日	2020年11月23日	38	项目经理				
40	40	规划整合	1 day	2020年11月24日	2020年11月24日	39	项目经理				
41	41	执行与监控	52 days	2020年11月25日	2021年2月5日						
42	42		1 day	2020年11月25日	2020年11月25日	7	项目经理,UI设计师,测i				
43	43	项目执行	19 days	2020年11月25	E2020年12月22	E					
44	44	主页		, , ,	, , , ,		程序员1,程序员2,程序员				
45	45	舆情分析监控系统	6 days	2020年11月25日	2020年12月3日						
46	46	数据概览	1 day	2020年11月26日	2020年11月27日						
47	47	平台数据概览	1 day	2020年11月26日	2020年11月27日	42	程序员1				
48	48	数据监控	2.13 days	2020年11月27日	2020年11月28日						
49	49	实时监控	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	46	程序员1				
50	50	报警管理	2 days	2020年11月30日	2020年12月1日						
51	51	报警通知	1 day	2020年11月30日	2020年11月30日	48	程序员2				
52	52	智能预警配置	1 day	2020年12月1日	2020年12月1日	51	程序员2				
		任务		外部里程碑 ◇	手动摘要总成		基线里程碑 ◇				
		1-1		11.17-11-6	手动摘要		基线总结				
项目・5	未畅_ml.mpp		♦	非活动里程碑 ◇			进 度				
	(020年12月1			■ 非活动摘要 ■			手动进度 ————				
		项目摘要		■ 手动任务		_ ↓					
		外部任务		又工期	基线						
第 2 页											


标识号	标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
53	53	系统管理	2 days	2020年12月2日	2020年12月3日		_
	54	用户管理	1 day	2020年12月2日	2020年12月2日	52	程序员3
	55	权限管理	1 day	2020年12月3日	2020年12月3日	54	程序员3
	56	后台	10 days	2020年11月28日	2020年12月11日		程序员1,程序员2,程序员
57	57	爬虫模块	6 days	2020年11月28日	2020年12月7日		
58	58	对网站进行限	E取 2 days	2020年11月26日	2020年11月27日	42	程序员1
59	59	对数据进行扩 和处理	取 4 days	2020年11月30日	2020年12月3日	58	程序员1
60	60	数据存储	1 day	2020年12月4日	2020年12月4日	59	程序员1
61	61	情感分析模块	7 days	2020年11月28日	2020年12月8日		
62	62	对数据进行预	〔处∃2 days	2020年11月26日	2020年11月27日	42	程序员2
63	63	计算词向量	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	62	程序员2
64	64	训练模型	3 days	2020年11月30日	2020年12月2日	63	程序员2
65	65	热词变化词频构	莫块 10 days	2020年11月28日	2020年12月11日		
66	66	连接ES	2 days	2020年11月26日	2020年11月27日	42	程序员3
67	67	将数据存储进	-	2020年11月27日	2020年11月27日	66	程序员3
68	68	指定时间段热	· ·	2020年11月30日	2020年12月1日	67	程序员3
69	69	指定时间段情	感 5 days	2020年12月2日	2020年12月8日	68	
70	70	项目监控	3 days	2020年11月26日	2020年11月28日		
71	71	各项指标监控	1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	42	测试员1,项目经理
72	72	监控评审	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	71	UI设计师,项目经理
73	73	变更评审	1 day	2020年11月28日	2020年11月28日	72	UI设计师,项目经理
74	74	例会	1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	42	UI设计师,项目经理,测证
75	75	管理干系人	3 days	2020年11月26日	2020年11月30日		
76	76	发布项目信息	1 day	2020年11月26日	2020年11月26日	42	<mark>项目经理</mark>
77	77	报告监控指标	1 day	2020年11月27日	2020年11月27日	42	项目经理
		任务				!:	
		拆分		11.75-1 6-6	于	Д.	■ 蒸线主作時 〉 基线总结
-E P						т I	
	项目: 宋畅_ml.mpp 日期: 2020年12月1日		_	非活动里程碑◇	仅开始时间	C .	进度 ————————————————————————————————————
口朔, 乙	020平12月1	11421	0	非活动摘要	【 仅完成时间]	手动进度 ——————
		项目摘要	U	手动任务	期限	•	
		外部任务		仅工期	基线		•
				第	3 页		


标识号	标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
78	78	干系人沟通	1 day	2020年11月30日	2020年11月30日	42	项目经理
79	79	团队建设	3 days	2020年11月30日	2020年12月2日		
80	80	培训	2 days	2020年11月30日	2020年12月1日	42	UI设计师,测试员1,测试
81	81	娱乐活动	1 day	2020年12月2日	2020年12月2日	42	UI设计师,测试员1,测试
82	82	沟通	1 day	2020年12月2日	2020年12月2日	42	UI设计师,测试员1,测试
83	83	采购	1 day	2020年12月3日	2020年12月4日	42	项目经理
84	84	项目验收	1 day	2020年12月22日	2020年12月23日	43	UI设计师,测试员1,测试
85	85	收尾	5 days	2020年12月23	日2020年12月29	日	
86	86	项目终验	2 days	2020年12月23日	2020年12月25日	84	UI设计师,测试员1,测试
87	87	结束采购	1 day	2020年12月23日	2020年12月24日	84	<mark>项目经理</mark>
88	88	项目内部收尾	2 days	2020年12月23日	2020年12月25日	84	UI设计师,测试员1,测试




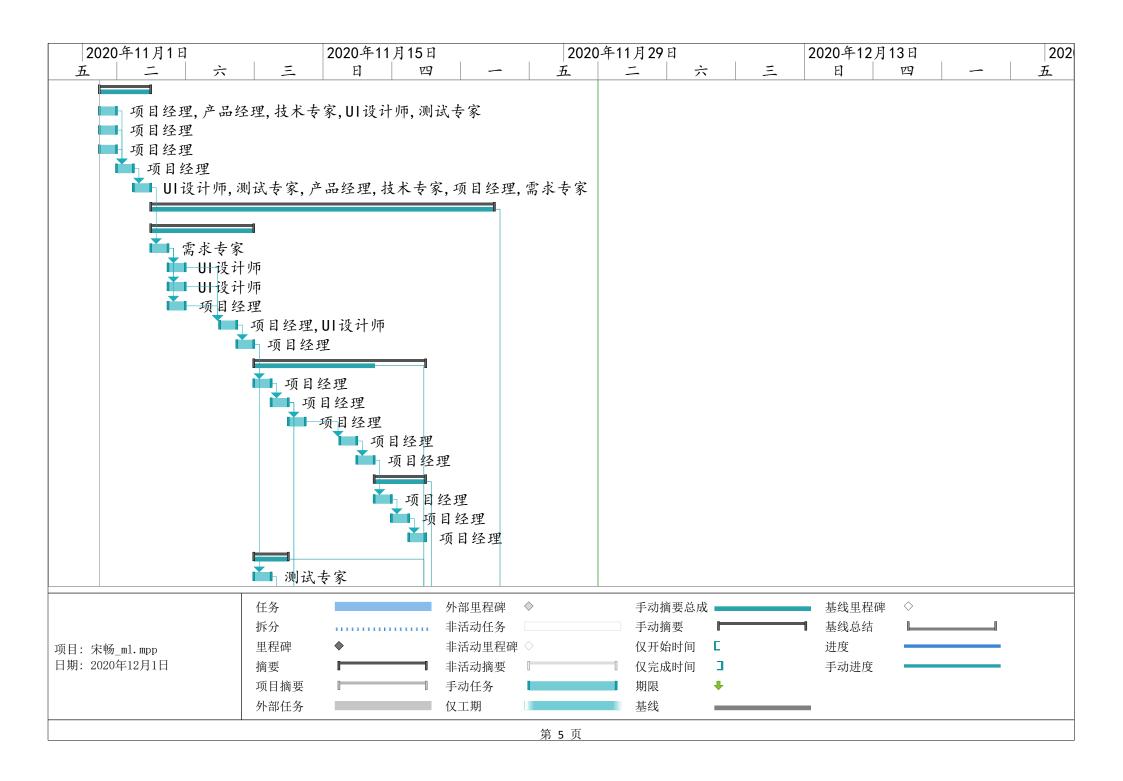


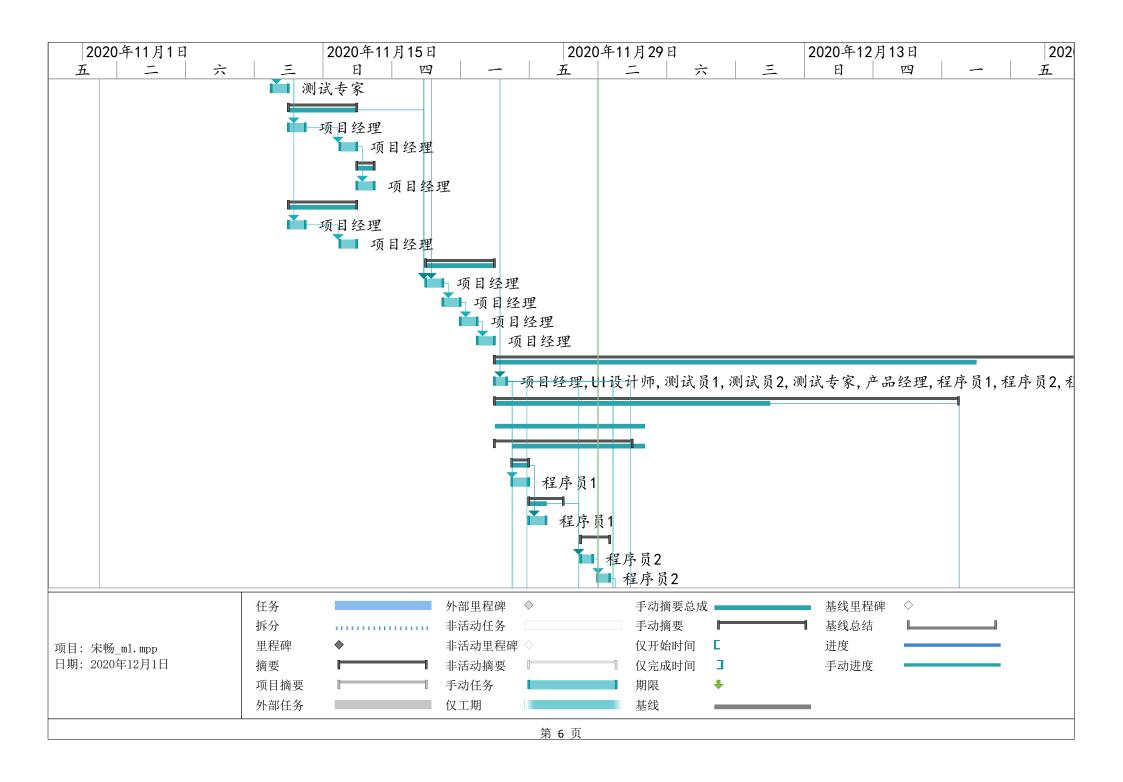


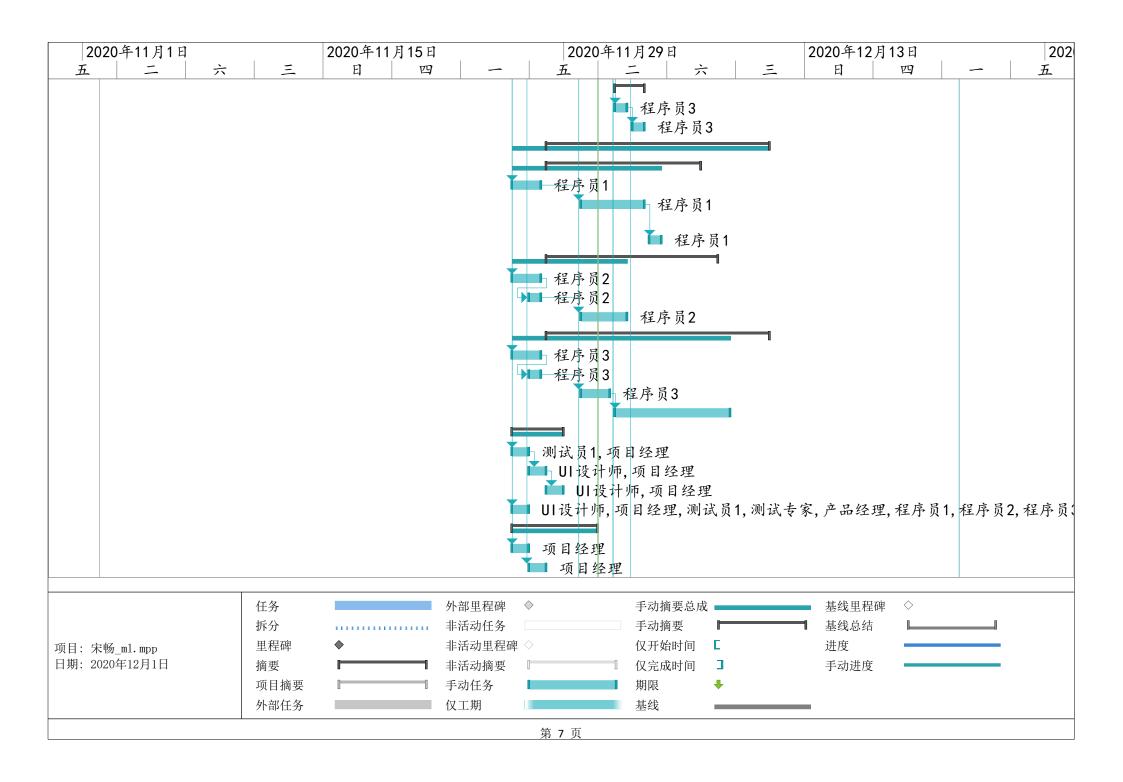

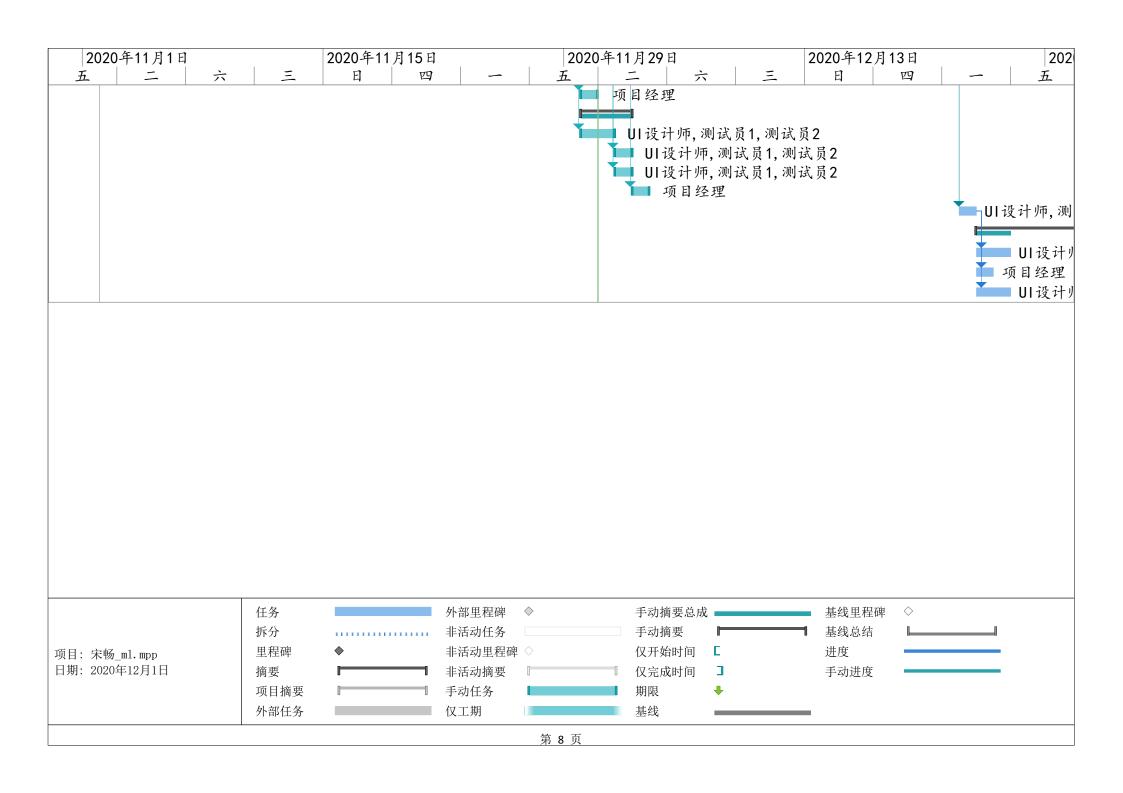

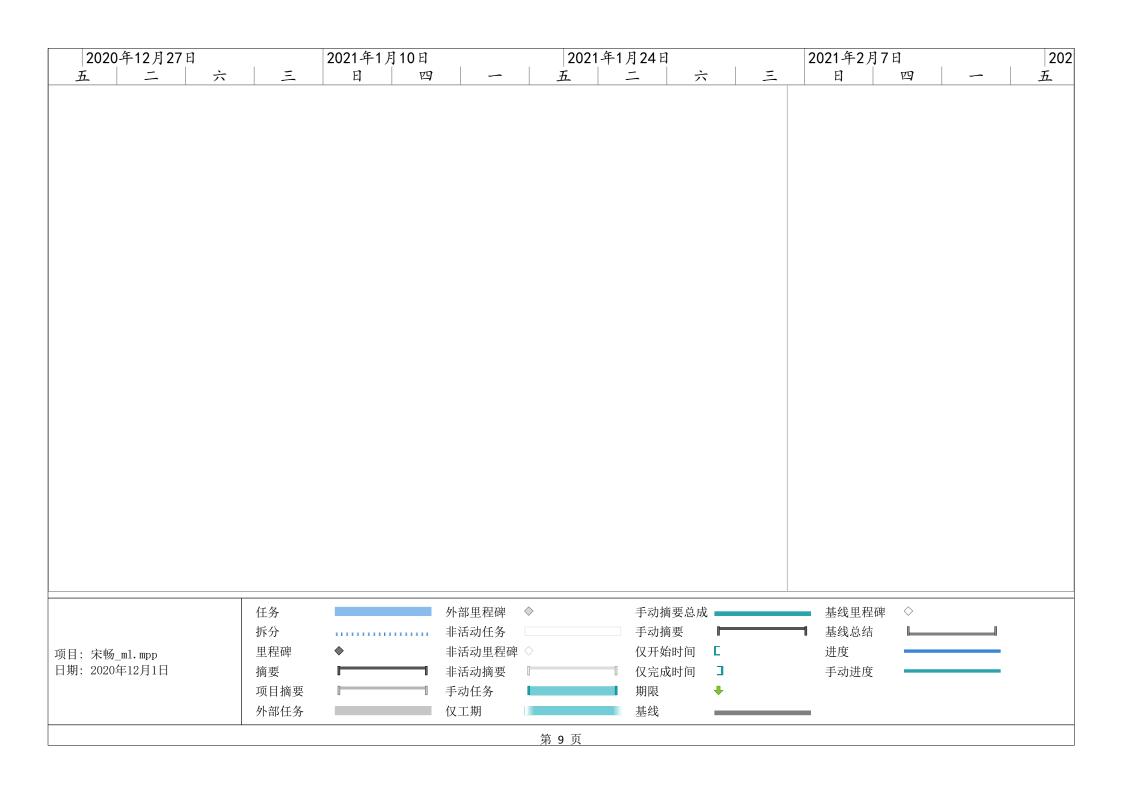

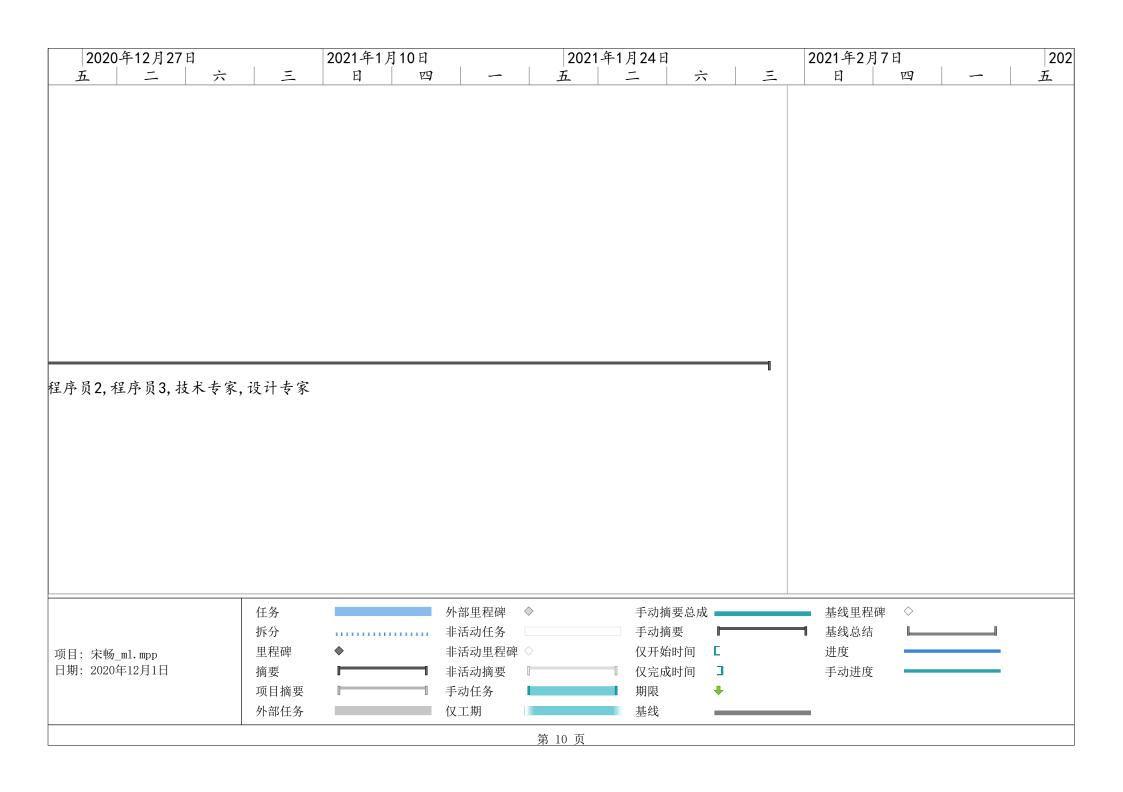

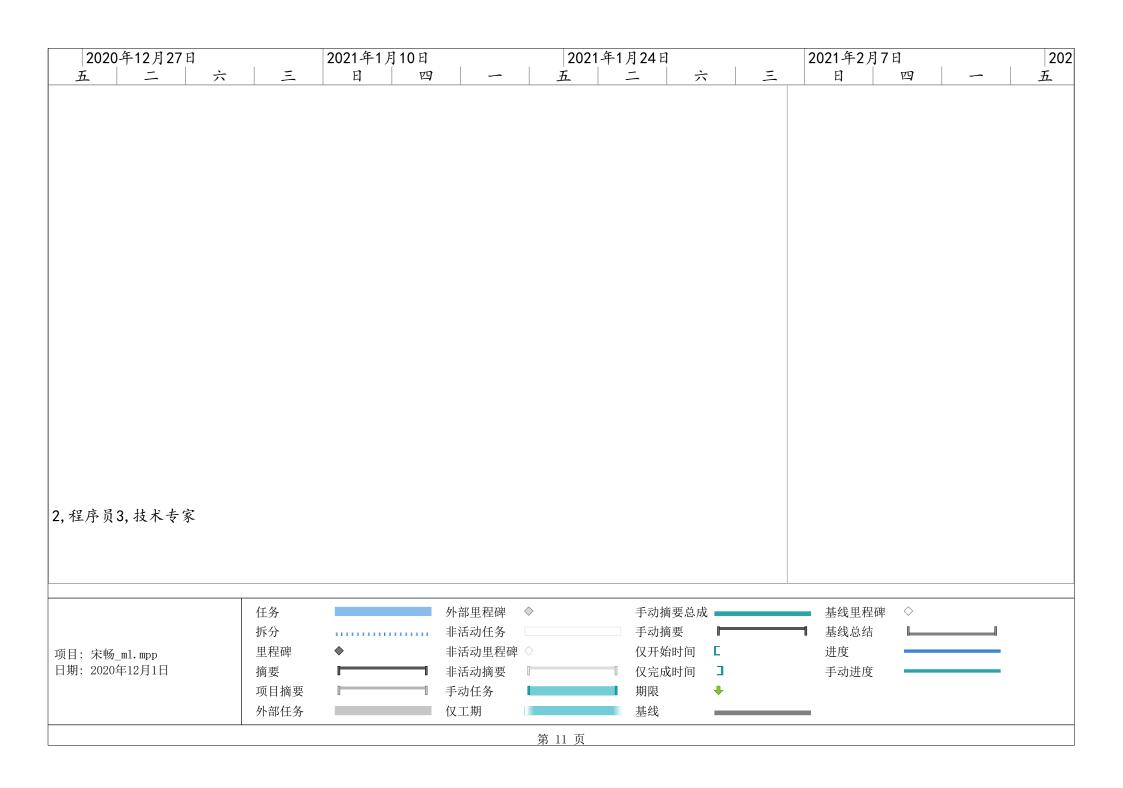

2020-	<u>年12月27</u>	日		2021年1	月10日		202	1年1)	月24日			2021年2月7日			
五	=	六	三	日日	四	_	五		二		=	日	四	_	202 <u>五</u>
设计师,测	试员1,测元 一	试员2,设	计专家												
UI设计师 项目经理	,测试员1	,测试员2	,设计专家	E											
UI设计师	,测试员1	,测试员2	,设计专家	ξ											
			任务			外部里程碑	♦		手动摘要总成			基线里程碑	→		
			拆分			非活动任务	•		手动摘要			基线总结	<u> </u>		
项目: 宋畅_	_ml. mpp		里程碑	♦		非活动里程碑				С		进度			
日期: 2020年			摘要			非活动摘要			仅完成时间	3		手动进度			
			项目摘要			手动任务			期限	•					
			外部任务			仅工期			基线			1			
							第 12 页								
